
Lageplan



02.-30. Jänner 2012: Humus abtragen Aushub Fahrsilo und Güllegrube



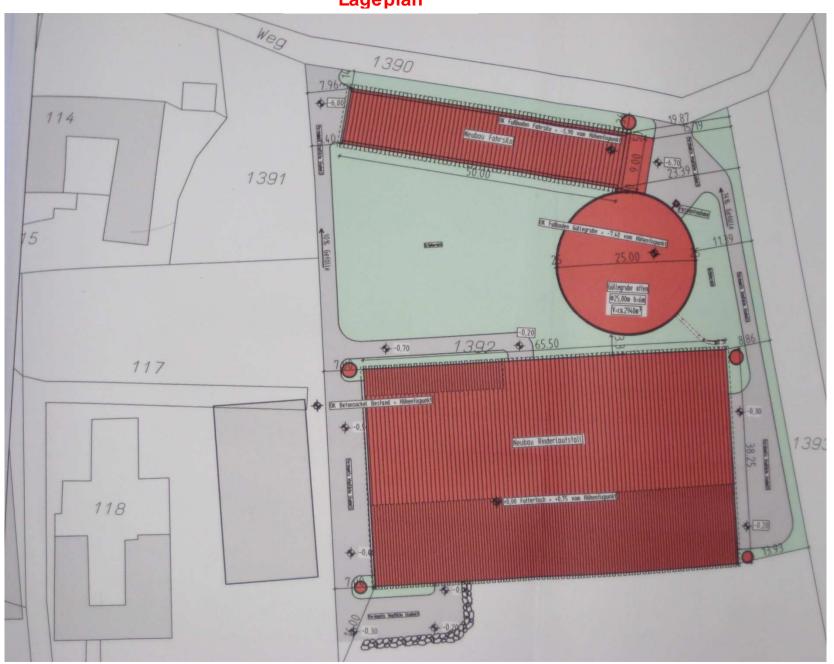

27. Jänner - 21. Februar 2012: Herstellen Bodenplatte Fahrsilo





22.-29. Februar 2012: Aufstellen und ausbetonieren der Wände





01.-02. März 2012: Eisenlegen und Betonieren Grubensohle







05.-08. März 2012: Einschalen und betonieren der Güllegrubenmauer





12.-13. März 2012: Ausschalen der fertigen Güllegrube





24.-30. März 2012: Planieren und Abschieben der Stallfläche inklusive Festwalzen





04.-05. April 2012: Aushub und Abschalung Fundamente, Melkgrube und Querkanal





10.-11. April 2012: Eisenlegen, Betonieren Querkanal, Melkgrube, Fundamente





13. April 2012: Aufstellen Melkgrube, Querkanal und Fundamentwände





16.-18. April 2012: Abschalen und Betonieren des Melk- und Kälberebereichs sowie Querkanal







19.-20. April 2012: Aufstellen der Außenwände und Wände des Warte- und Melkbereichs









23.-25. April 2012: Abschalen und betonieren der Säulen und Wände







26.-29. April 2012: Ausschalen der Säulen, Verlegung Wasserleitung, Planie Jungviehseite und Säulensetzen





30. April 2012: Aufstellen Barnwände und Gärsaftbehälter







01.-03. Mai 2012: Aufstellen Fressstandsteher, Eisenlegen und Abschalen Jungviehseite





04.-09. Mai 2012: Betonieren JV-Seite Eisenlegen Vorwarteplatz, Betonieren und Aufstellen Zwischenwände (+ ausbetonieren) JV-Seite





10.-12. Mai 2012: Planie Gärsaftbehälter, Kuhseite und Futtertisch; Betonieren Gärsaftbehälter und Vorwarteplatz; Liegeboxensäulen und Einzelfressstände aufstellen









13.-16. Mai 2012: Eisenlegen und betonieren Kuhseite





19. Mai 2012: Planie Futterplatz und Siolplatz





21. Mai 2012: Wände stellen und ausbetonieren Kuhseite





22.-23. Mai 2012: Brunnen bohren



22.-24. Mai 2012: Eisenlegen und betonieren Futtertisch und Futterplatz







06. Juni-02. Juli 2012: Anlieferung und Aufstellen Holzkonstruktion Dach







































02.-05. Juli 2012: Montage Tore







05.-06. Juni 2012: Aufstellen Fahrsiloüberdachung





09.-10. Juli 2012: Verschlagen Fahrsilo, Anbringung Blechverkleidung Stall






11.-12. Juli 2012: Verlegung Stromkabelund Fernwärmeleitung





16.-25. Juli 2012: Verfliesen Melkstand

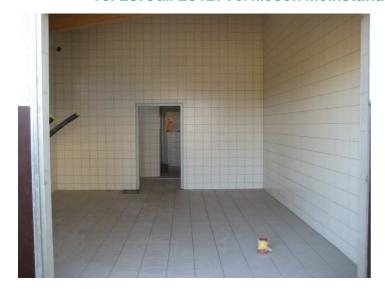




20. Juli - 12. August 2012: Montage gesamte Aufstallungstechnik, Lichtfirst, Ventilatoren, Tränken





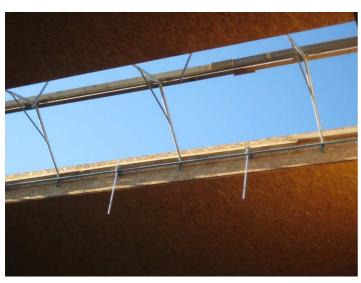











30. Juli – 03. August 2012: Montage Melkstand










06.-12. Verkabelung





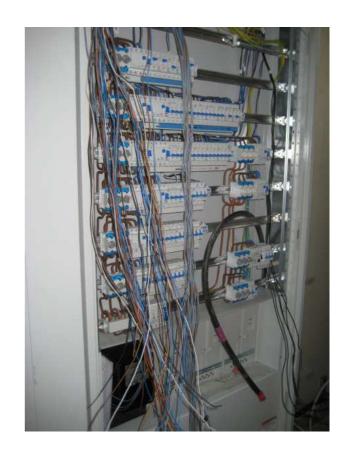

06.-14. August 2012: Montage Fenster





20.-22. August 2012: Inbetriebnahme Brunnen und Güllerührwerk





23.-31. August 2012 Anlieferung und Montage Fütterungsroboter









27.-31. August 2012 Installation Wasser Einstreu Jungviehseite





05.September 2012: Einzug mit Jungvieh und Inbetriebnahme Fütterungsroboter









11. September 2012: Einzug mit Kühen und Kälbern













29. September 2012: Einzug mit Sultan





